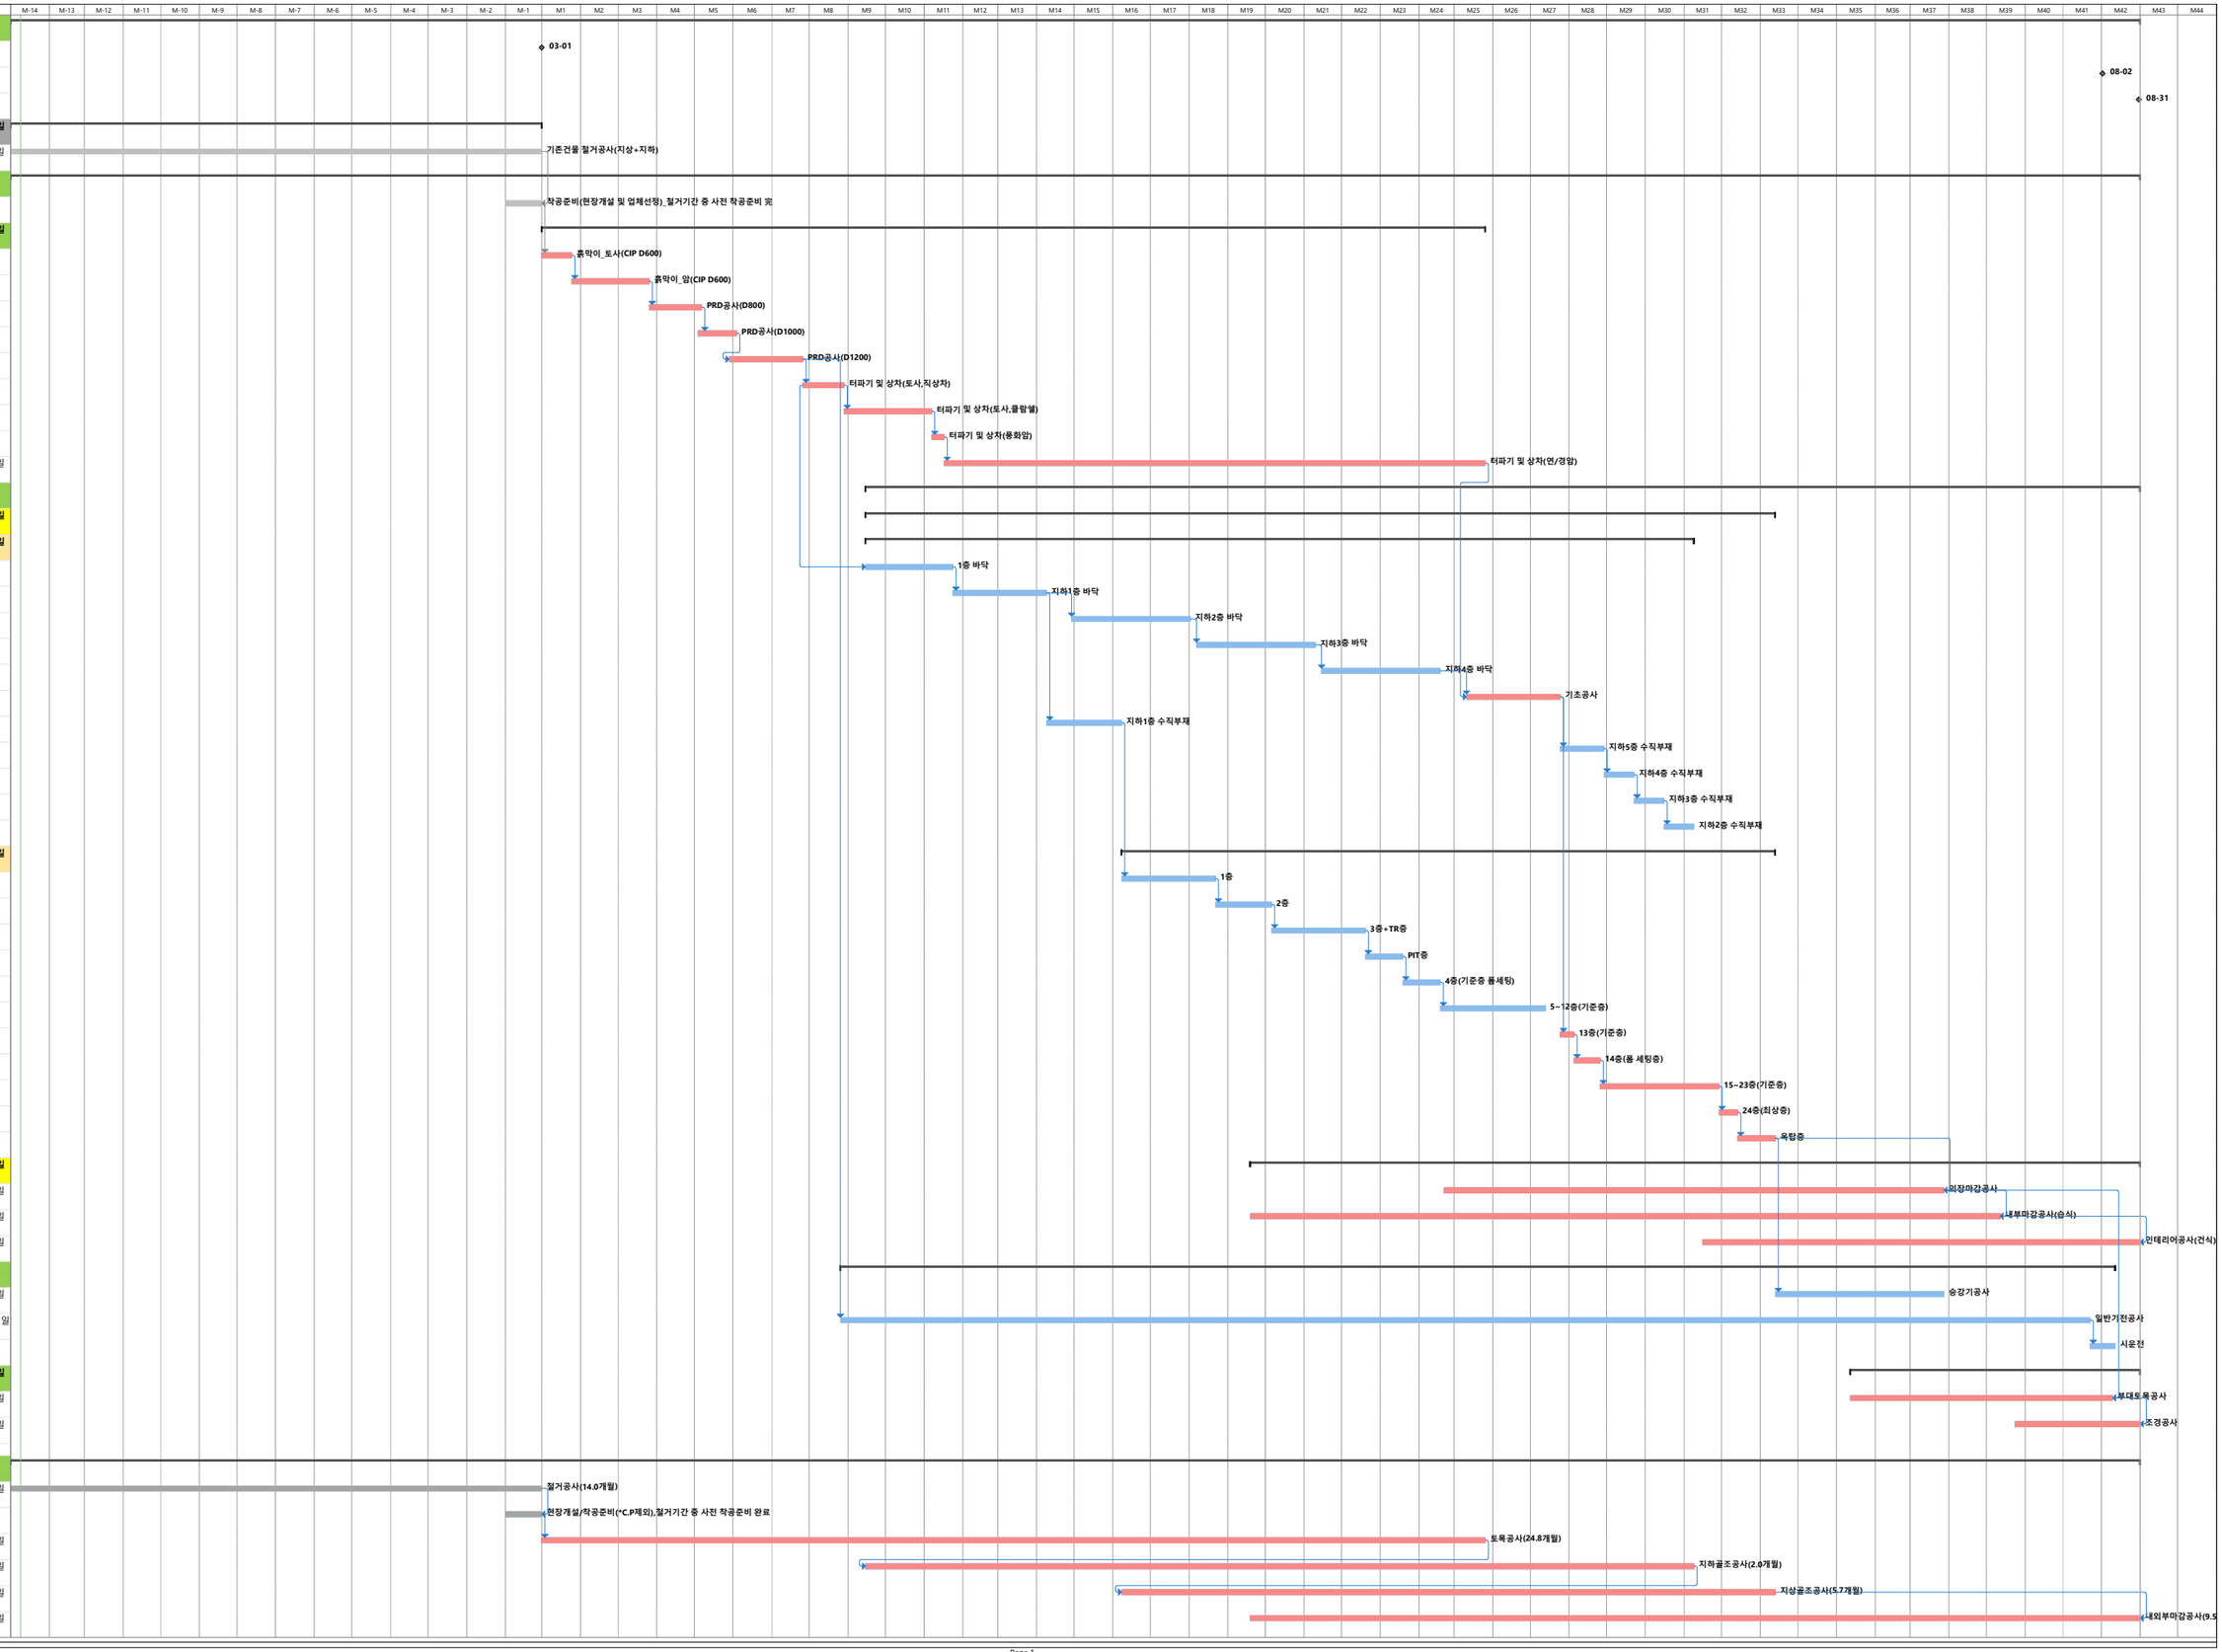ID	작업 이름	기간
1	**Mile Stone**	**1704 일**
2	착공	0 일
3	소방필증	0 일
4	준공	0 일
5	**철거공사**	**425 일**
6	기존건물 철거공사(지상+지하)	425 일
7	**착공준비 및 현장개설**	**1704 일**
8	착공준비(현장개설 및 업체선정)	29 일
9	**토목공사**	**755 일**
10	흙막이(토사)	24 일
11	흙막이(암)	62 일
12	PRD공사(D800)	42 일
13	PRD공사(D1000)	31 일
14	PRD공사(D1200)	59 일
15	터파기 및 상차(토사, 직상차)	33 일
16	터파기 및 상차(토사, 클람셸)	70 일
17	터파기 및 상차(풍화암)	10 일
18	터파기 및 상차(연/경암)	433 일
19	**건축공사**	**1020 일**
20	**골조공사**	**728 일**
21	**지하골조**	**663 일**
22	지상1층 바닥	70 일
23	지하1층 바닥	75 일
24	지하2층 바닥	95 일
25	지하3층 바닥	95 일
26	지하4층 바닥	95 일
27	기초	75 일
28	지하1층(H:11.0m) 수직부재	60 일
29	지하5층(H:4.6m+7 수직부재	35 일
30	지하4층 수직부재(H:3.6m)	24 일
31	지하3층 수직부재(H:3.6m)	24 일
32	지하2층 수직부재(H:4.3m)	24 일
33	**지상골조**	**523 일**
34	1층[H:6.5~8.0m]	75 일
35	2층[H:4.3m]	45 일
36	3층(TR)[H: 6.83m]	75 일
37	PIT층[H: 1.8m]	30 일
38	4층[H: 3.05m]	30 일
39	5~12층[H: 2.8m]	84 일
40	13층[H: 2.8m]	11 일
41	14층[H: 3.0m]	21 일
42	15~23층[H: 3.0m]	95 일
43	24층[H: 3.2m]	15 일
44	옥탑층	30 일
45	**마감공사**	**712 일**
46	외장마감공사	400 일
47	내부마감공사	600 일
48	인테리어공사	350 일
49	**기전공사**	**1020 일**
50	승강기공사	135 일
51	일반기전공사	1000 일
52	시운전	20 일
53	**부대토목공사**	**232 일**
54	부대토목공사	210 일
55	조경공사	100 일
56		
57	**C.P공기**	**1704 일**
58	철거공사	425 일
59	현장개설/착공준비	29 일
60	토목공사	755 일
61	지하골조공사	663 일
62	지상골조공사	523 일
63	내외부마감공사	712 일
