예 정 공 정 표

공 사 명 : 응암동 32-12

공 종			준비작업	1개월	2개월	3개월	4개월
건축공사	착공신고		펜스설치				
	인입공사(전기,수도)		가설펜스 협의 / 서류준비 / 수도사업소 연락 / 수도굴착 / 가설전기설치 / 이웃집 방문 / 착공관련 지자체 점검				
	흙막이공사	흙막이/파일	측량	흙막이 공사	흙막이 해체		
	토목공사		계측 설치	잔토처리	되메우기작업		
	철근콘크리트공사	8회타설	교통공사 이관 / 교통공사 협의 / 착공준주	버림타설 / 자하층 골조공사	1층 골조공사 / 1층타설 / 2층타설	2층 골조공사 / 3층타설 / 4층타설	5층타설 / 지붕타설
	목구조 공사		안전관리 계획서 및 철도 안전관리계획서				
	비계공사				2층 비계공사	옥상 비계공사	
	조적공사						조적공사
	단열공사				단열공사		창호주변 단열보강
	방수공사	액체,우레탄,복합					창호주변방수 / 지하층방수 / 옥상방수 / 단수체크
	미장공사						미장공사
	미장공사 (면처리공사)						면처리 공
	방통미장						
	지붕공사						
	창호공사				창호 실측 및 발주	창호 발주	창호공사
	금속공사						창호주변 마감공사 / 재료분리공사
	외부마감공사	듀라스텍	량체크 및 듀라스텍 발주준	발주			외부마감
	수장공사	석고 및 인테리어					
		계단공사		형틀 규준틀 작업		실내 규준틀 작업(허리먹)	
		도어설치					
	도장공사	실내도장 및 외부					
	석 공 사						
	타일공사 및 마루공사						
	도 어 공 사	실외 및 실내				외부 프레임 실측 / 프레임 발주	외부 프레임 도어공사
	전열교환기	건축주 공사분		전열교환기 제품 및 단가 제안 / 전열교환기 계약			
	에어콘공사	건축주 공사분		에어콘 제품 및 단가 제안 / 에어콘계약			
	코킹공사						
	부대토목공사	부대토목,인입			부대토목공사		
	조경공사	건축주 직영공사					되메우기 작업
	가구공사	주방가구,붙박이장		주방가구 기구 확정			
	인입공사/ 잔손보기						
	준공청소						
	전기공사					전기공사	
	설비공사		지하층 보일러 부분 검토			설비공사	
	건축주 승인 (건축주 공 사분)	태양광,주차장,CCTV,비디오폰		비디오폰 인터폰 제안 / 비디오 인터폰 확정			cctv 설치공사
	설계사무실 승인						
NOTE							

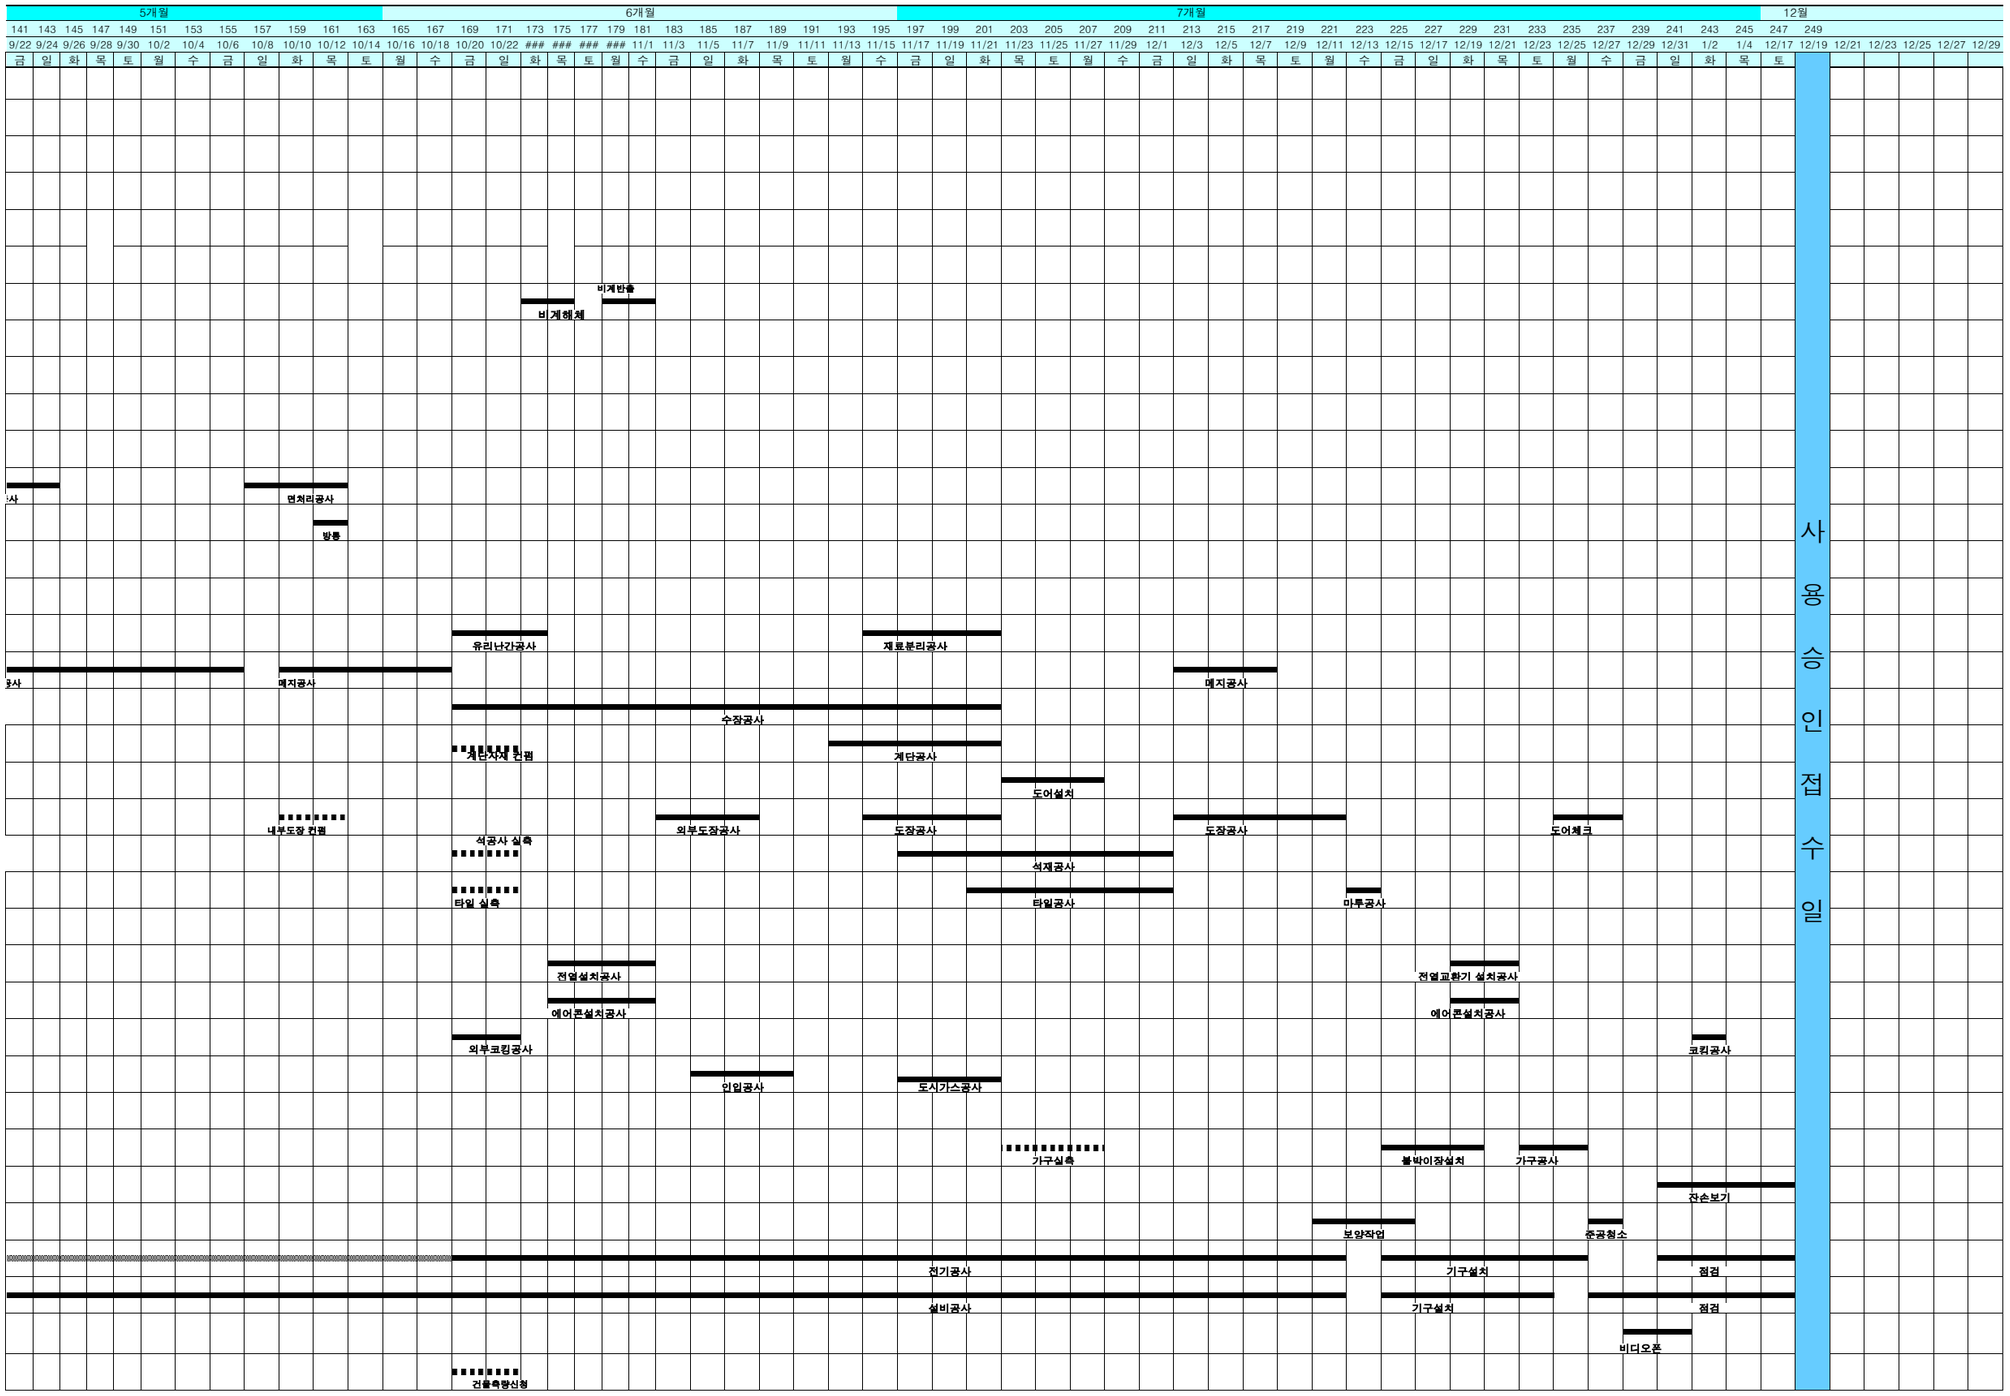
5개월
6개월
7개월
12월
사용승인접수일
비계반출
비계해체
면허리공사
방통
유리난간공사
재료분리공사
메지공사
메지공사
수장공사
계단자재 컨펌
계단공사
도어설치
내부도장 컨펌
외부도장공사
도장공사
도장공사
도어체크
석공사 실측
석재공사
타일 실측
타일공사
마루공사
전열설치공사
전열교환기 설치공사
에어콘설치공사
에어콘설치공사
외부코킹공사
코킹공사
인입공사
도시가스공사
가구실측
붙박이장설치
가구공사
잔손보기
보양작업
준공청소
전기공사
기구설치
점검
설비공사
기구설치
점검
비디오폰
건물측량신청
